


# GSK - Bautenstände

Stand 27.11.2017

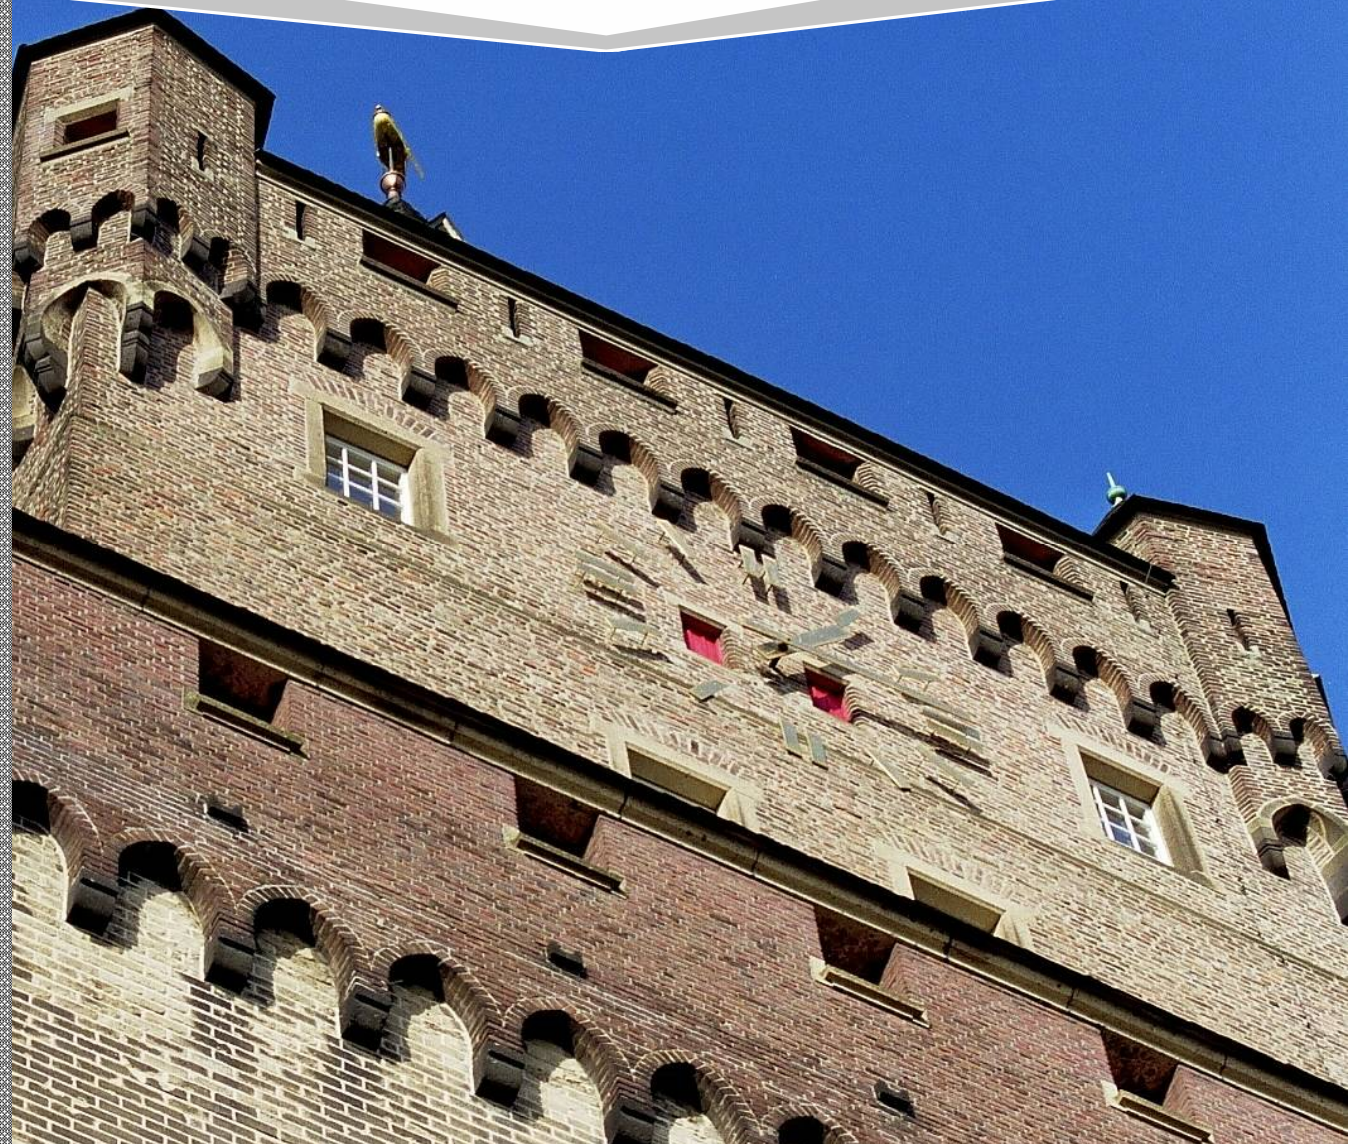

- Projekt Energetische Sanierung der Pausenhalle der Karl-Leisner-Grundschule  
Kostenaufstellung/Bauzeitenplan
- Projekt „Studienseminar“  
Kostenaufstellung/Bauzeitenplan
- Projekt GGS „An den Linden“  
Kostenaufstellung/Bauzeitenplan

- Montessorischule (Spyckstraße)
- Joseph Beuys Gesamtschule (Hoffmannallee)
- Projekt Interimsstandort Gesamtschule Rindern  
Landwehr Kostenaufstellung/Bauzeitenplan
- Gesamtschule Kleve (Eichenallee)
- Ausblick 2018



# KLEVE Projekt „energet. Sanierung Karl-Leisner-Grundschule“

<b>Kostenaufstellung brutto</b>		Fördermittel:		rot
<b>in EUR</b>		KInvFöG:	225.000 EUR	gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
250.000,00	197.058,00	153.226,00	43.832,00	250.000,00
<b>Bauzeiten:</b>				
Baubeginn:		10.07.17		rot
Teil-Fertigstellung:		31.08.17		gelb
Heizkörperinstallation u.a.:		2018		grün

<b>Kostenaufstellung brutto</b>				rot
<b>in EUR</b>				gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
1.800.000,00	1.248.253,00	530.309,00	717.944,00	1.804.682,15
<b>Bauzeiten:</b>				
Abschluss Planungsphase:		02.05.2017		rot
Bauzeit:		05/17-04/18		gelb
				grün

<b>Kostenaufstellung brutto</b>		Fördermittel:		rot
<b>in EUR</b>	LED-Beleuchtung: 16.293 EUR / Gute Schule			gelb
Stand:	2020: 2.102.564 EUR / KInvFöG 847.620 EUR			grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
4.800.000,00	4.391.980,00	2.381.349,00	2.010.622,00	4.704.481,31
<b>Bauzeiten:</b>				inkl. Ausbau DG
Fertigstellung 1. Bauabschnitt:	Fertig			rot
Fertigstellung 2. Bauabschnitt:	März 2018			gelb
Fertigstellung 3. Bauabschnitt:	August 2018			grün



# **KLEVE Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen**

## **„Montessorischule“**

- Auftrag an Architekten v.d. Linde erteilt
- Vor-Ort Termin zur Weiterführung der Planung/Entwürfe wahrgenommen
- Interne Präsentation erster Entwürfe in der 22. KW
- Abstimmung mit der Schule ist erfolgt
- Kostenschätzung wird aktualisiert und abgestimmt
- Präsentation der Entwürfe in der heutigen Schulausschusssitzung

Förderung aus Gute Schule 2020



# **KLEVE Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen**

## **„Joseph Beuys Gesamtschule“ (Hoffmannallee)**

- Begleitung / Aufbereitung der Unterlagen zur Abgabe eines Angebotes zur Machbarkeitsstudie / Werkstattverfahren, vergleichbar mit KAG
- Auftakttermin am 22.06.17 in Kleve
- Auftrag wurde an Architekt Hausmann erteilt
- Vorbereitungen für die Workshopveranstaltung in Planung





**KLEVE**

# Projekt „Gesamtschule Kleve (Landwehr)“

<b>Kostenaufstellung brutto</b>				Rot
<b>in EUR</b>				gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
540.000,00*	429.138,00	47.260,00	381.878,00	540.000,00
<b>Bauzeiten:</b>	* incl. Anschaffung Sanitärcontainer ca. 30.000,00 EUR			
Projektweiterführung:	10.07.17			rot
				gelb
Fertigstellung:	Februar 2018			grün



# **KLEVE Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen**

## **„Gesamtschule Kleve“ (Eichenallee)**

- Drucksache zur Beauftragung der Projektsteuerung und juristischen Unterstützung für den Vergabeausschuss am 06.06.2017
- Kick Off zwischen LLR, Phetschow und Thiel und GSK am 29.06.17
- Erstellung der Aufgabenbeschreibung, Vertragsausfertigungen, Matrizen und weiterer Vergabeunterlagen zur europaweiten Ausschreibung eines Generalplaners



# **KLEVE Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen**

## **„Gesamtschule Kleve“ (Eichenallee)**

- Vertragsabschluss mit Projektsteuerer und Juristen; Aufgabenbeschreibung, Vertrag und Matrizen werden mit LLR, Phetschow und Thiel und dem GSK erstellt
- Fachbereichsübergreifende interne Projektgruppe konform „Neues Rathaus“ wurde installiert (KW46)
- Sukzessive Abstimmung und Fertigstellung der notwendigen Vergabeunterlagen

- Aufgrund der erfolgreichen Akquisetätigkeit hinsichtlich neuer technischer Mitarbeiter können zukünftig alle investiven Bauprojekte aus dem schulischen Bereich betreut werden.
- Die hierzu erforderlichen organisatorischen Grundlagen werden derzeit erarbeitet.



**KLEVE**

GSK - Bautenstände

Stand 27.11.2017

**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit**
