GSK - Bautenstände
Stand 21.09.2017

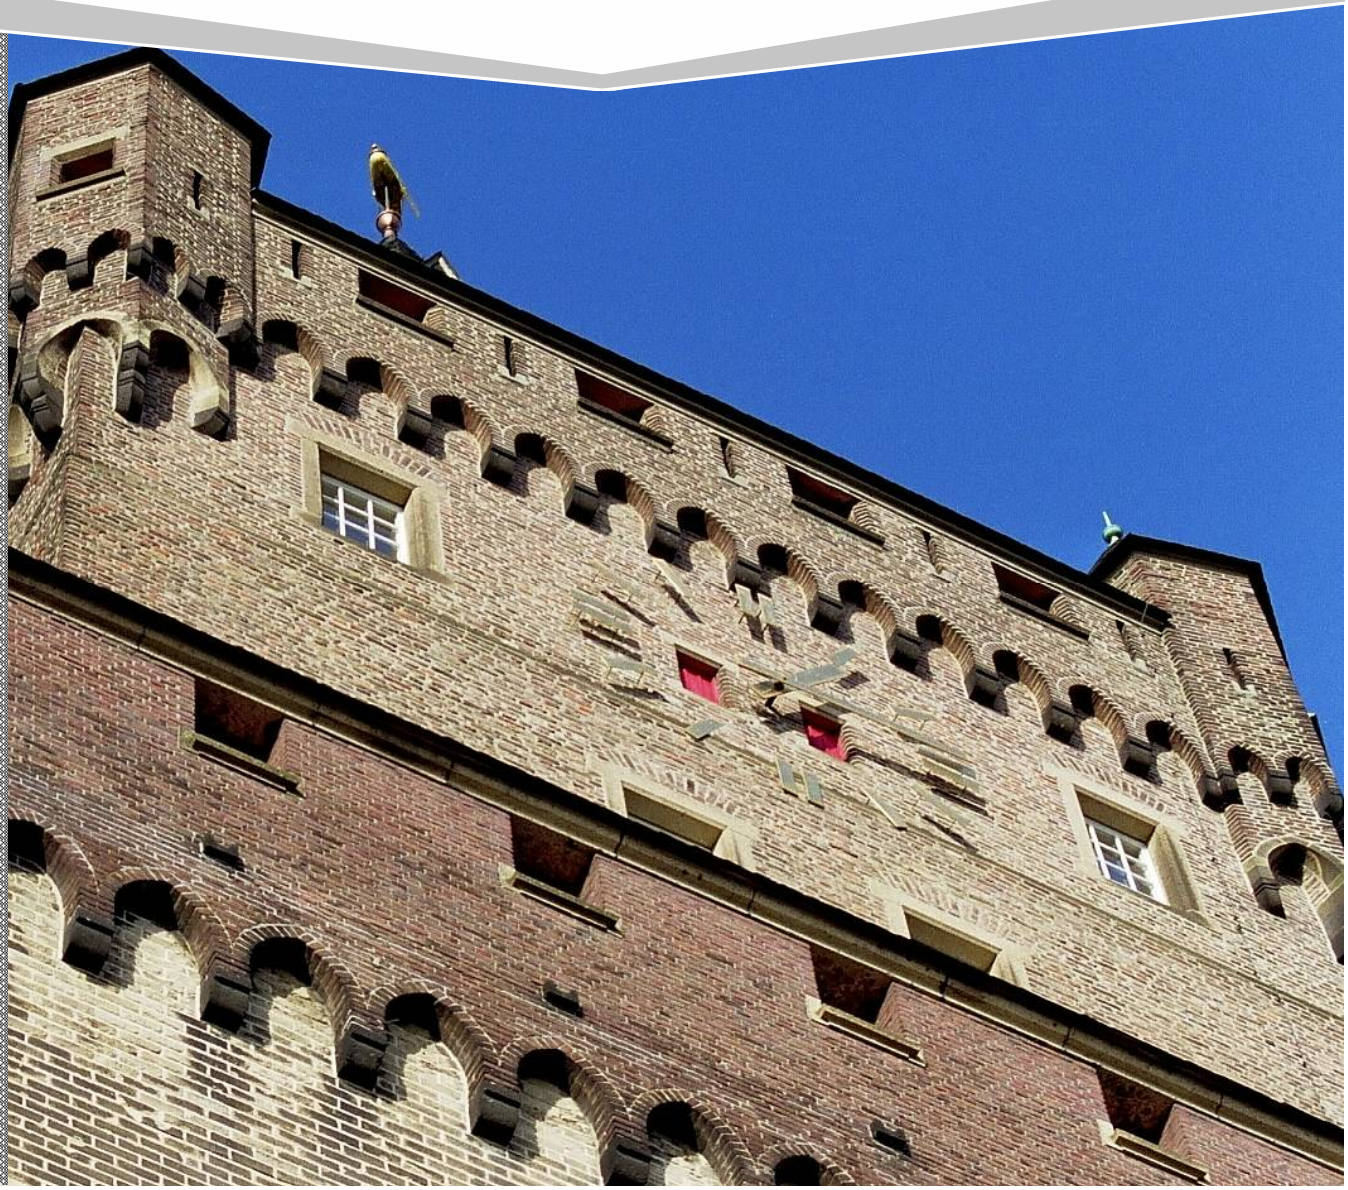

GSK - Bautenstände

Agenda

- Projekt Energetische Sanierung der Pausenhalle der Karl-Leisner-Grundschule Kostenaufstellung/Bauzeitenplan

- Projekt „Studienseminar“ Kostenaufstellung/Bauzeitenplan

- Projekt GGS „An den Linden“ Kostenaufstellung/Bauzeitenplan

Agenda

- Montessorischule (Spyckstraße)
- Joseph Beuys Gesamtschule (Hoffmannallee)
- Projekt Interimsstandort Gesamtschule Rindern Landwehr Kostenaufstellung/Bauzeitenplan
- Gesamtschule Kleve (Eichenallee)

Projekt „energet. Sanierung Karl-Leisner-Grundschule“

Kostenaufstellung brutto		Fördermittel:		rot
in EUR		KInvFöG:	225.000 EUR	gelb
Stand:				grün
ursprüngliche Kosten-Schätzung	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
250.000,00	157.904,00	103.603,00	54.301,00	250.000,00
Bauzeiten:				
Baubeginn:		10.07.17		rot
Teil-Fertigstellung:		31.08.17		gelb
Heizkörperinstallation u.a.:		2018		grün

Projekt „Studienseminar“

Kostenaufstellung brutto				rot
in EUR				gelb
Stand:				grün
Ursprüngliche Kosten-schätzung	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
1.800.000,00	1.248.253,00	380.261,00	867.992,00	1.804.682,15
Bauzeiten:				
Abschluss Planungsphase:		02.05.2017		rot
Bauzeit:		05/17-04/18		gelb
				grün

Projekt GGS „An den Linden“

Kostenaufstellung brutto	Fördermittel:			rot
in EUR	LED-Beleuchtung: 16.293 EUR / Gute Schule 2020: 2.102.564 EUR / KInvFöG 847.620 EUR			gelb
Stand:				grün
Ursprüngliche Kosten-schätzung	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
4.800.000,00	4.391.980,00	2.202.349,00	2.189.631,00	4.704.481,31
Bauzeiten:				inkl. Ausbau DG
Fertigstellung 1. Bauabschnitt:		In Kürze		rot
Fertigstellung 2. Bauabschnitt:		März 2018		gelb
Fertigstellung 3. Bauabschnitt:		August 2018		grün

Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen

„Montessorischule“

→ Auftrag an Architekten v.d. Linde erteilt
→ Vor-Ort Termin zur Weiterführung der Planung/Entwürfe wahrgenommen
→ Interne Präsentation erster Entwürfe in der 22. KW
→ Abstimmung mit der Schule ist erfolgt
→ Kostenschätzung wird aktualisiert und abgestimmt
→ Präsentation der Entwürfe voraussichtlich in der nächsten Schulausschusssitzung

Förderung aus Gute Schule 2020

Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen

„Joseph Beuys Gesamtschule“ (Hoffmannallee)

→ Begleitung / Aufbereitung der Unterlagen zur Abgabe eines Angebotes zur Machbarkeits-studie / Werkstattverfahren, vergleichbar mit KAG

→ Auftakttermin am 22.06.17 in Kleve

→ Drucksache zur Beauftragung ist in Bearbeitung

Projekt „Gesamtschule Kleve (Landwehr)“

Kostenaufstellung brutto				Rot
in EUR				gelb
Stand:				grün
ursprüngliche Kosten-Schätzung	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
510.000,00*	395.728,00	22.365,00	373.363,00	540.000,00
Bauzeiten:	* excl. Anschaffung Sanitärcontainer ca. 30.000,00 EUR			
Projektweiterführung:		10.07.17		rot
				gelb
Fertigstellung:		Februar 2018		grün

Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen

„Gesamtschule Kleve“ (Eichenallee)

→ Drucksache zur Beauftragung der Projekt-steuerung und juristischen Unterstützung für den Vergabeausschuss am 06.06.2017

→ Kick Off zwischen LLR, Phetschow und Thiel und GSK am 29.06.17

→ Erstellung der Aufgabenbeschreibung, Vertragsausfertigungen, Matrizen und weiterer Vergabeunterlagen zur europa-weiten Ausschreibung eines Generalplaners

Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen

„Gesamtschule Kleve“ (Eichenallee)

→ Planung einer fachbereichsübergreifenden internen Projektgruppe konform „Neues Rathaus“

→ Erläuterungen zum Vergabeverfahren

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
